




Relatório Mensal

Execução de

obras e serviços

MÊS: SETEMBRO

ANO: 2023

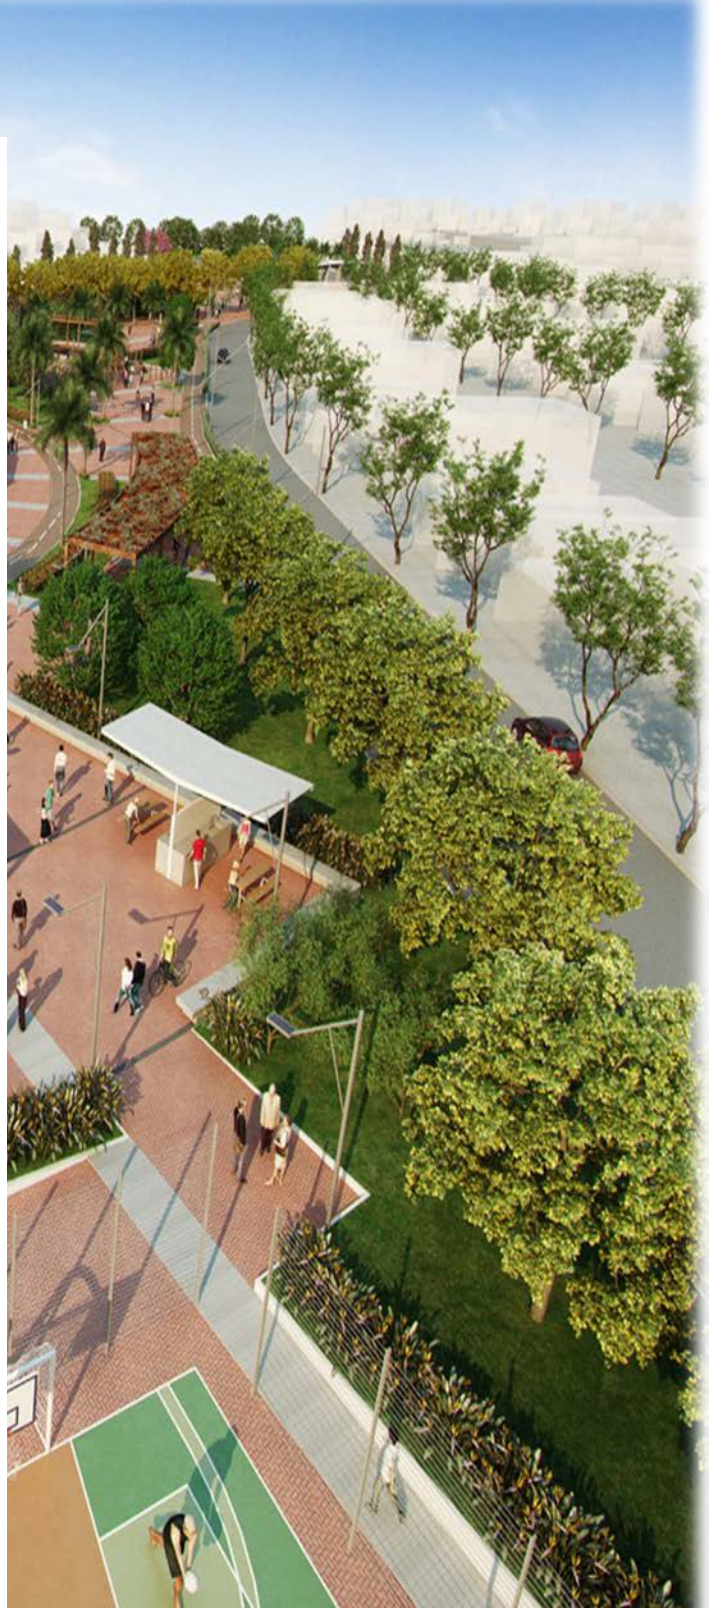

Número de convênio: 016/2021

Objeto da obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO MUNICIPIO DE PLACAS

Nome do contratado: W. R. P. MARQUES EIRELI

CNPJ do contratado: 22.814.959/0001-01

Local da Execução da obra: Rua Frei Reneiro – QD 13, lote 1/A KM 221

Origem do Recurso: SEDOP

Modalidade da licitação: TOMADA DE PREÇOS

Número do Processo Licitatório: 002/2022

Data início da obra: 10/01/2022

Data final da obra: 09/06/2024

Valor total da Obra: R\$ 917.862,36

Valor total aplicado: R\$ 478.741,75

Valor a desembolsar: R\$ 439.120,57

Percentual total aplicado: 52,16%

Percentual mensal aplicado: 17,66%

Valor aplicado no mês Vigente: R\$ 162.069,50

Transferências recebidas: R\$ 162.069,50

Transferências realizadas: R\$ 162.069,50

Número de convênio: 297/2022

Objeto da obra: CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS PARA FEIRA DE EXPOSIÇÕES DO MUNICÍPIO DE PLACAS/PA

Nome do contratado: Sem licitação

CNPJ do contratado: Sem licitação

Local da Execução da obra: Rodovia Transamazônica km 240

Origem do Recurso: SEDOP

Modalidade da licitação: Sem licitação

Número do Processo Licitatório: Sem licitação

Data início da obra: 01/07/2022

Data final da obra: 01/07/2023

Valor total da Obra: R\$ 329.334,53

Valor total aplicado: R\$ 251.726,40

Valor a desembolsar: R\$ 77.608,13

Percentual total aplicado: 76,43%

Percentual mensal aplicado: 76,43%

Valor aplicado no mês Vigente: R\$ 251.726,40

Transferências recebidas: R\$ 251.726,40

Transferências realizadas: R\$ 251.726,40
